Zał. 9

Zaprojektowanie i budova drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
Część 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 dług. ok. 8,700 km.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU [%]
STAN NA DZIEŃ 29.02.2020

Inżynier: MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów NIP: 734-24-60-395

Wykonawca: Lider: Strabag Sp.z o.o., Wysoka, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Partner: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o.,, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] - DOKUMENTY WYKONAWCY [do KM-2] ORAZ REALIZACJA ROBÓT [od KM-2]

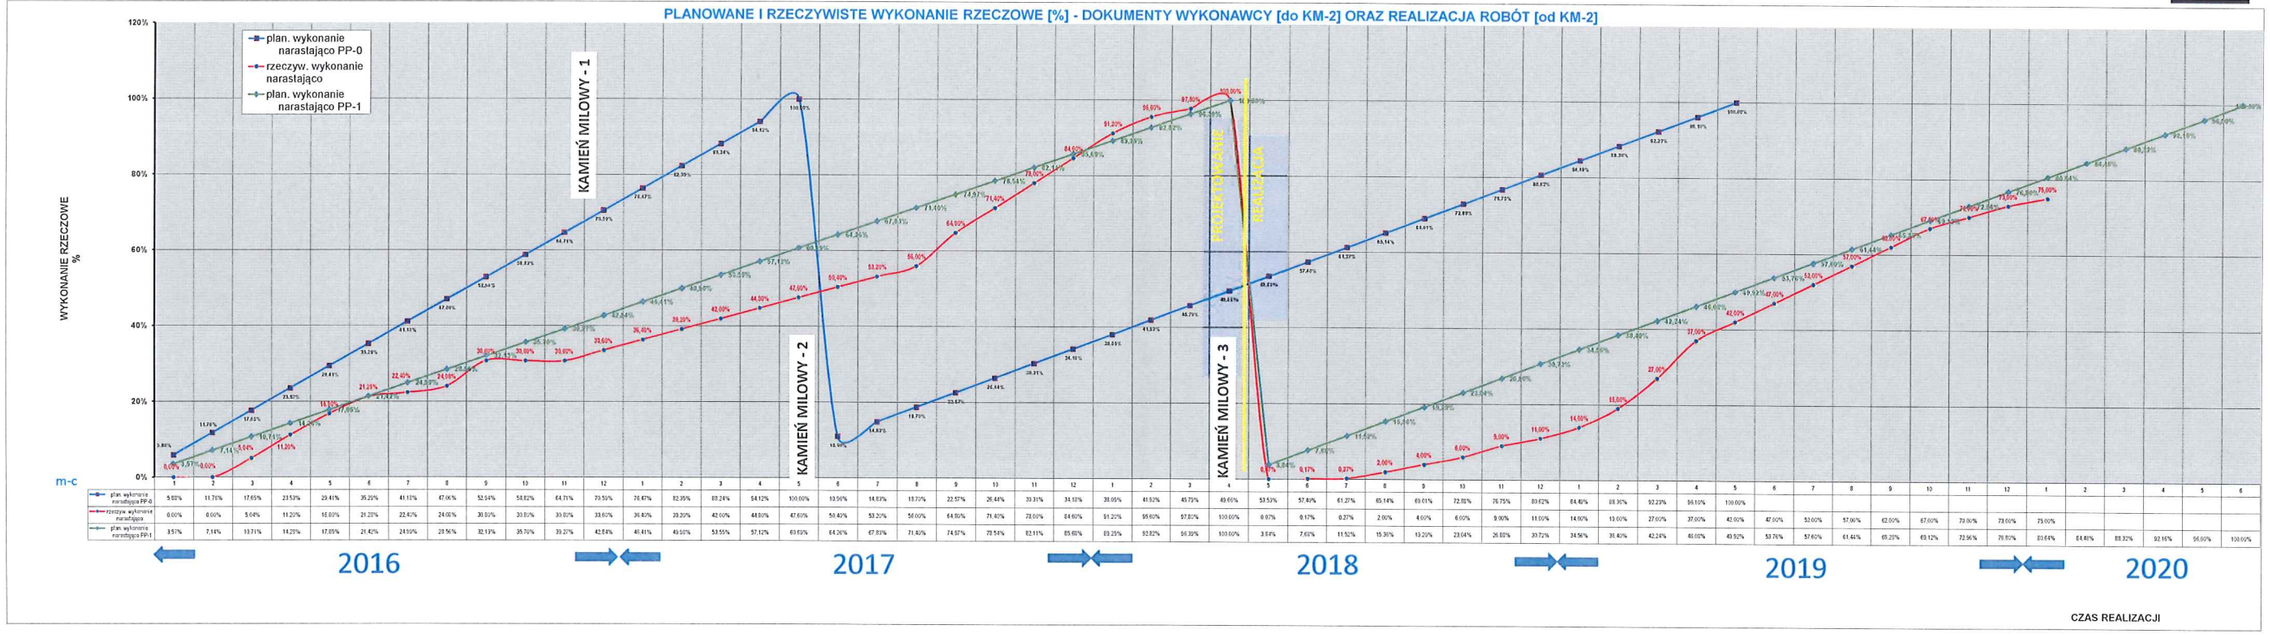

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019												2020					
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
plan. wykonanie miesięcznie PP-0	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.50%	
plan. wykonanie narastająco PP-0	5.00%	11.70%	17.65%	23.53%	29.41%	35.29%	41.18%	47.06%	52.94%	58.82%	64.71%	70.59%	76.47%	82.35%	88.24%	94.12%	100.00%	10.56%	14.83%	18.70%	22.57%	26.44%	30.31%	34.18%	38.05%	41.92%	45.79%	49.66%	53.53%	57.40%	61.27%	65.14%	69.01%	72.88%	76.75%	80.62%	84.49%	88.36%	92.23%	96.10%	100.00%															
plan. wykonanie miesięcznie PP-1	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.57%	3.61%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	4.60%	
plan. wykonanie narastająco PP-1	3.57%	7.14%	10.71%	14.28%	17.85%	21.42%	24.99%	28.56%	32.13%	35.70%	39.27%	42.84%	46.41%	49.98%	53.55%	57.12%	60.69%	64.26%	67.83%	71.40%	74.97%	78.54%	82.11%	85.68%	89.25%	92.82%	96.39%	100.00%	3.64%	7.61%	11.52%	15.36%	19.20%	23.04%	26.80%	30.72%	34.56%	38.40%	42.24%	46.08%	49.92%	53.76%	57.60%	61.44%	65.28%	69.12%	72.96%	76.80%	80.64%	84.48%	88.32%	92.16%	96.00%	100.00%
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0.00%	0.00%	5.04%	6.19%	3.80%	4.48%	1.12%	1.69%	6.72%	0.00%	0.00%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	6.80%	6.40%	2.20%	2.20%	0.67%	0.17%	0.17%	0.27%	2.00%	4.00%	6.00%	3.00%	11.00%	14.00%	13.00%	27.00%	37.00%	42.00%	47.00%	52.00%	57.00%	62.00%	67.00%	70.00%	73.00%	75.00%						
rzeczyw. wykonanie narastająco	0.00%	0.00%	5.04%	11.20%	15.00%	21.20%	22.40%	24.00%	30.80%	30.80%	30.80%	33.60%	36.40%	39.20%	42.00%	44.80%	47.60%	50.40%	53.20%	56.00%	64.80%	71.40%	78.00%	84.60%	91.20%	97.60%	100.00%	100.00%	0.67%	0.17%	0.27%	0.27%	2.00%	4.00%	6.00%	9.00%	11.00%	14.00%	13.00%	27.00%	37.00%	42.00%	47.00%	52.00%	57.00%	62.00%	67.00%	70.00%	73.00%	75.00%						
											KM-1						KM-2							KM-3																														
