Zał. 9

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
Część 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 dług. ok. 8,700 km.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul Ogrodowa 21.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU [%]
STAN NA DZIEŃ 30.09.2020

Inżynier: MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów NIP: 734-24-80-395

Wykonawca: Lider: Strabag Sp z o.o., Wysoka, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Partner: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o.,, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

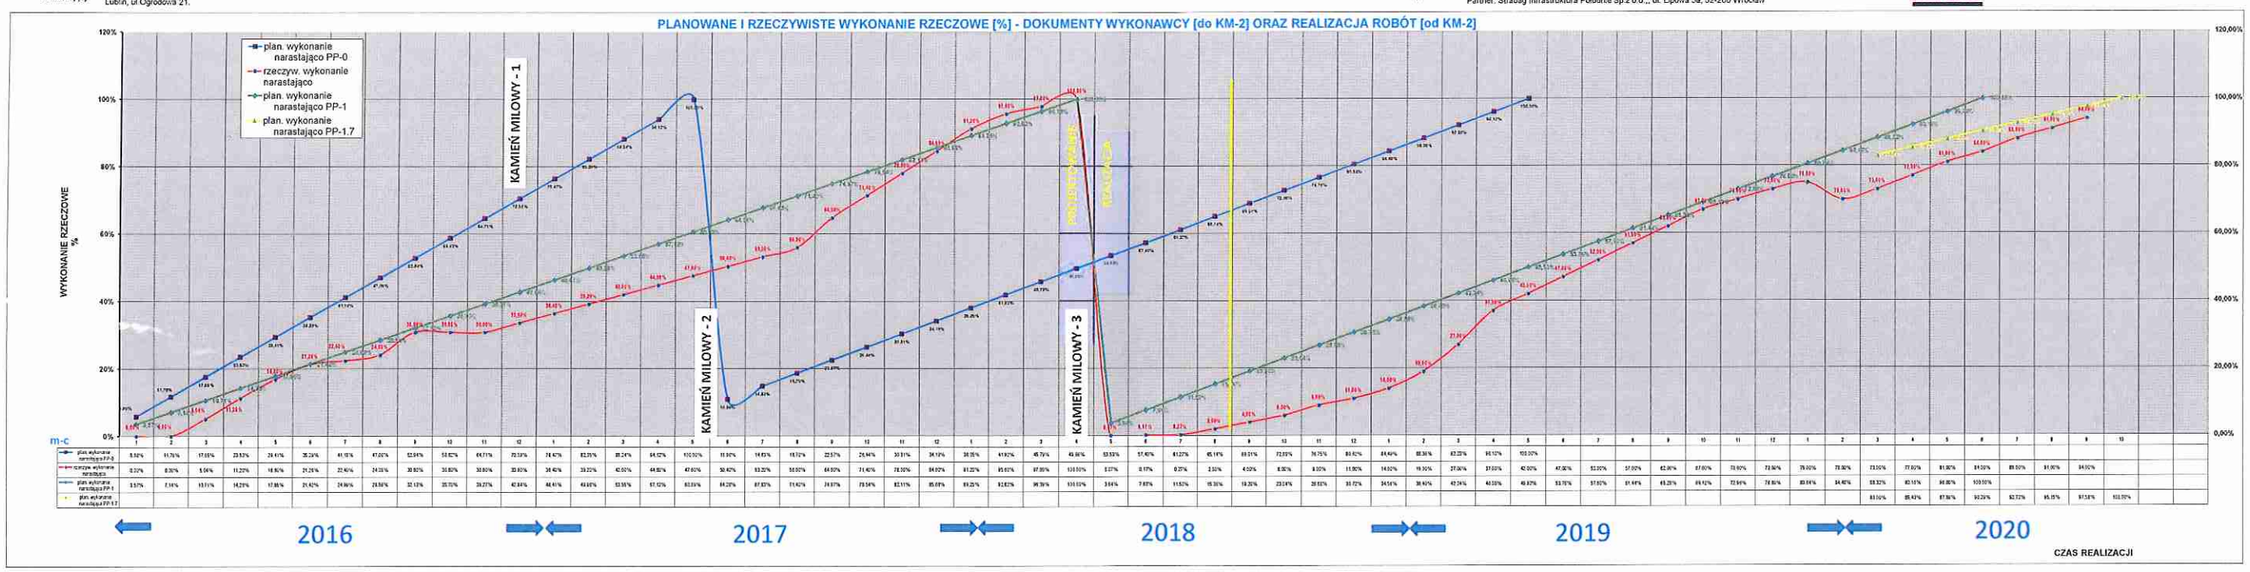

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019												2020											
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja okresowa	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
plan. wykonanie miesięcznie PP-0	5,52%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%																								
plan. wykonanie narastająco PP-0	5,52%	11,75%	17,55%	23,53%	29,41%	35,29%	41,18%	47,06%	52,94%	58,82%	64,71%	70,59%	74,47%	80,25%	86,24%	94,12%	100,00%	11,96%	14,85%	19,72%	22,57%	25,94%	30,91%	34,19%	38,35%	41,92%	45,79%	49,66%	53,53%	57,40%	61,27%	65,14%	69,01%	72,88%	76,75%	80,62%	84,49%	88,36%	92,23%	96,10%	100,00%																								
plan. wykonanie miesięcznie PP-1	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%
plan. wykonanie narastająco PP-1	3,57%	7,14%	10,71%	14,28%	17,85%	21,42%	24,99%	28,56%	32,13%	35,70%	39,27%	42,84%	46,41%	49,98%	53,55%	57,12%	60,69%	64,26%	67,83%	71,40%	74,97%	78,54%	82,11%	85,68%	89,25%	92,82%	96,39%	100,00%	3,64%	7,68%	11,82%	15,96%	19,25%	23,04%	26,82%	30,72%	34,56%	38,40%	42,24%	46,08%	49,92%	53,76%	57,60%	61,44%	65,28%	69,12%	72,96%	76,80%	80,64%	84,48%	88,32%	92,16%	96,00%	100,00%												
plan. wykonanie miesięcznie PP-1.7																																																																				
plan. wykonanie narastająco PP-1.7																																																																				
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0,00%	0,00%	5,94%	8,16%	5,62%	4,46%	1,12%	1,68%	0,72%	0,00%	0,00%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	4,40%	4,40%	2,29%	2,29%	0,97%	0,16%	0,16%	1,73%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	3,84%	5,00%	5,00%	10,52%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	2,89%	-9% *)	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%	4,00%	3,00%	3,00%			
rzeczyw. wykonanie narastająco	0,00%	0,00%	5,94%	14,10%	19,92%	24,38%	25,50%	27,18%	27,90%	27,90%	27,90%	30,71%	33,52%	36,33%	39,14%	41,95%	44,76%	47,57%	50,38%	53,19%	56,00%	58,81%	61,62%	66,02%	70,42%	72,71%	75,00%	75,97%	76,13%	76,29%	78,02%	80,54%	83,06%	85,58%	88,10%	90,62%	94,46%	99,46%	104,46%	115,98%	120,98%	125,98%	130,98%	135,98%	140,98%	145,98%	150,98%	153,98%	156,87%	151,87%	156,87%	160,87%	164,87%	167,87%	171,87%	174,87%

KM-1 KM-2 KM-3

*) - spadek w wyniku podpisania Aneksu nr 3
